

Baustelle Renovierung Steigstraße 7 72622 Nürtingen	Bauherr Max Mustermann Fa. Mustermann	Planung Alex Westermann	Koordinator Sven Kühn Orgeda GmbH	Bauablauf																						
				2019									2020													
				November		Dezember			Januar		Februar			März												
Gefährdungen / Einrichtungen	Maßnahmen / Lösungen	Arbeitsschutz Ausschreibungstexte	Bestimmungen	Dokumente Bemerkungen	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organisation der Baustelle	Gefährdungsanalyse Arbeitsabläufe planen Arbeits- und Lagerplätze planen			Sige Plan Bauarbeitsplan Baustelleneinrichtungsplan																						
Baustelleneinrichtung																										
Baustellensicherung	Bauzaun / Tore	BM 10.2.51+10.2.53	UVV, Allg. Vorschr. VBG 14																							
Versorgung	Strom / Wasser / Telephon	GM C10+C11	UVV Eit.-Leitungen VBG 4																							
Entsorgung	Abwasser / Abfallwirtschaft	BM 01.2.9+01.2.13																								
Sozialeinrichtungen	Tagesunterkünfte / Sanitäranlagen	GM A173, BM 01.3.1bis01.3.2		Arbeitsstättenverordnung																						
Erste Hilfe / Notfallvorsorge	Verbandskasten / Ersthelfer usw.	GM A2																								
Brandschutz	Feuerlöscher	GM A5																								
Persönliche Schutzausrüstung	Sicherheitschuhe	GM A6+C43																								
Allgemeinbeleuchtung	öffentliche Beleuchtung	GM A6+C43																								
Im Freien und im Gebäude	Baustellenbeleuchtung / Leuchten	BM 01.5.1+01.5.3+01.5.4+01.5.6	UVV, Allg. Vorschr. VBG 1																							
Baustellenverkehr	Baustelleneinrichtungsplan	GM A96																								
Baugeräte	Standsicherheitsnachweise	GM B58+C106		Nachweis durch Statiker																						
Kran, Aufzug, Silo usw.	GM B60+B72																									
Baustellenvorbereitung																										
Erdleitungen	Leitungen orten, sichern, umlegen	GM D152	UVV Eit.-Leitungen VBG 4	Vorschriften Stadtwerke																						
Strom, Gas, Wasser, Telekom usw.																										
Nachbargebäude	Beweissicherung bei Rammarbeiten																									
Lärm-Emmision	eingeschränkte Arbeitszeit		UVV Lärm VBG 121																							
Lärm-Immision	Gehörschutz	GM A56	UVV Lärm VBG 121																							
Abbrucharbeiten																										
Bauzustände	Abbrucharweisung	GM D75+D76+D77																								
Demontage Bestuhlung																										
Abbruch Estrich/Putz																										
Demontage TGA																										
Demontage Zwischendecke																										
Erdarbeiten																										
Baugrube	Seitenschutz	GM C8, BM 03.3.4	UVV Bauarb, VBG 37																							
Gräben	Böschchen oder Verbau	GM D112+D113																								
Gerüstarbeiten																										
Raumgerüst																										
Mauererarbeiten																										
Montage - Fertigteile	Montageanweisung	GM D124																								
Schalungen	Lehrgerüste, Traggerüste	GM C122+C177																								
hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst	GM C45, BM 12.2	DIN 4420 Arbeitsgerüste																							
Bodenöffnungen	Umwehrung / Abdeckung	GM C8, BM 03.3.1+03.3.4	UVV Bauarb, VBG 37																							
Wandöffnungen	Seitenschutz	GM C8, BM 03.3.4	UVV Bauarb, VBG 37																							
Treppenläufe	Seitenschutz	GM C8, BM 03.3.10	UVV Bauarb, VBG 37																							
Schächte	Podeste	BM 05.2.1	UVV Bauarb, VBG 37																							
Stahlbauarbeiten																										
Bodenöffnungen	Umwehrung / Abdeckung	GM C8, BM 03.3.1+03.3.4	UVV Bauarb, VBG 37																							
Wandöffnungen	Seitenschutz	GM C8, BM 03.3.4	UVV Bauarb, VBG 37																							
Treppenläufe	Seitenschutz	GM C8, BM 03.3.10	UVV Bauarb, VBG 37																							



Brände verhüten

Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren
Brand melden

In Sicherheit bringen

Löschversuch unternehmen

Handfeuermelder betätigen
Notruf 112

Gefährdete Personen warnen/
Hausalarm betätigen
Hilflose mitnehmen
Türen schließen
Gegenzeichnen
Fluchwege folgen
Aufzug nicht benutzen
Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

Feuerlöscher benutzen
Löschschlauch benutzen
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z. B. Löschdecke)

Brandbekämpfung nach DIN 14298 | © Orgeda GmbH Wolfsluglen | Erstausgabe: 10.10.2017

Unfallärzte Notruf 112
Rettungsdienst Notruf 112
Feuerwehr Notruf 112
Polizei Notruf 110


Krankenhaus
Rettungsdienst
Notfallaufnahme

Persönliche Schutzausrüstung

- Handschuhe tragen, wenn durch GB gefordert
- Betreten der Baustelle nur mit Kopfschutz gestattet
- Bei Abbruch- und Schleifarbeiten Atemschutz erforderlich der Baustelle
- Augenschutz bei Arbeiten mit davonfliegenden Teilen erforderlich
- Betreten der Baustelle nur mit Schutzhelmen gestattet
- Wo erforderlich durch Gefährdungsbeurteilung, Schutzkleidung benutzen

Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegter Arbeitsplätze sind abzusperrern.

Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern.

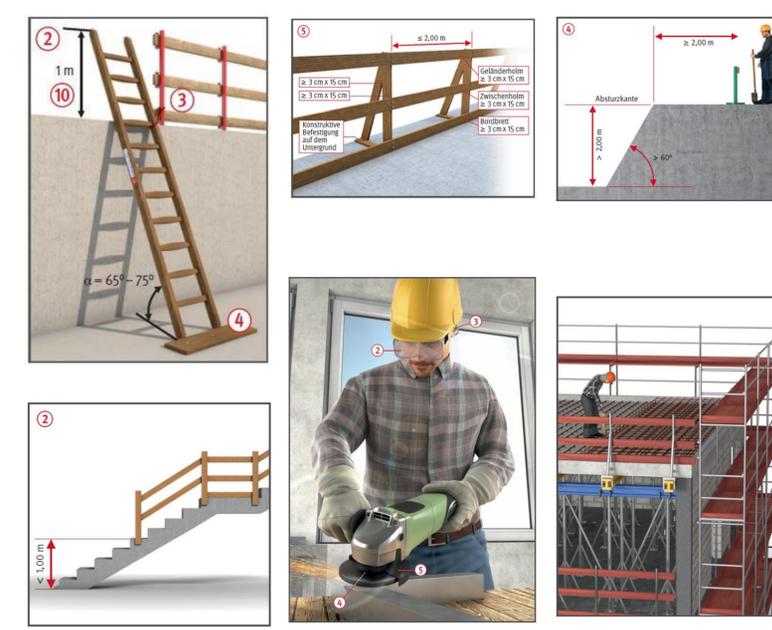

Esslinger Straße 15
72649 Wolfsluglen
Fon. 0176 - 89220007
Fax. 07022 - 209805-9
e-mail. info@orgeda.eu

Orgeda GmbH
Ingenieurbüro für Brandschutz und Fabrikplanung

Bezeichnung:
Sicherheit- und Gesundheitsplan

Projekt- Nr.	Maßstab:	Bauherr:	SiGeKo:	Erstellt:
0120_01_SK	-	Max Musterman	Sven Kühn	07.01.2020
